



第2-3章

项目立项与生存期模型



项目初始

项目
初始


项目
计划

项目执
行与控
制

项目
结束



PMBOK 第6版概观

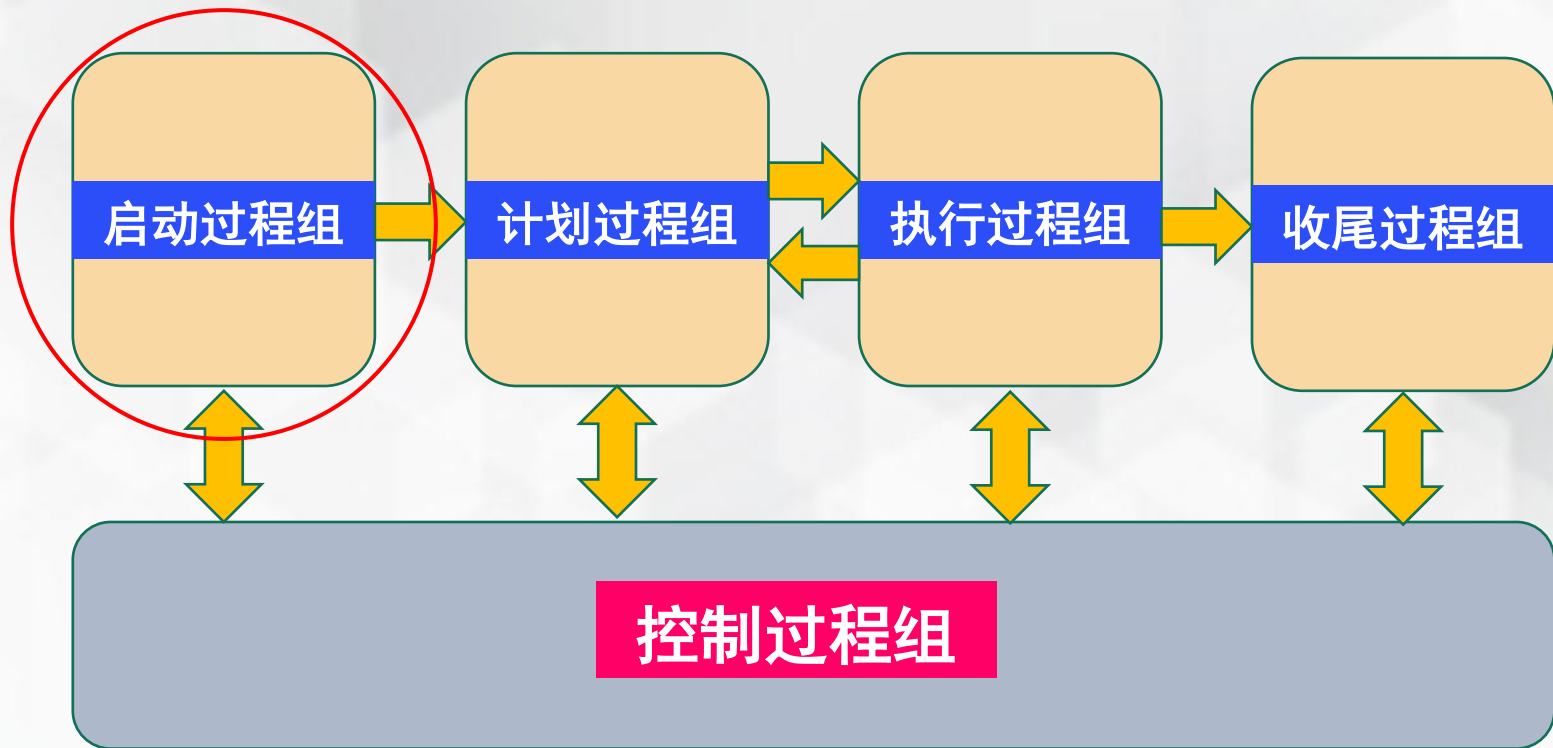



启动过程组

过程组/知识领域	启动过程组	计划过程组	执行过程组	控制过程组	收尾过程组
项目集成管理	编制项目章程	编制项目管理计划书	指导与管理项目执行	监控项目工作 实施集成变更控制	结束项目或阶段
项目范围管理		规划范围管理 收集需求 定义范围 创建任务分解结构		确认范围 控制范围	
项目时间管理		规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划		控制进度	
项目成本管理		规划成本管理 估算成本 制定预算		控制成本	
项目质量管理		规划质量管理	实施质量保证	控制质量	
项目人力资源管理		规划人力资源管理	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		
项目沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对		控制风险	
项目采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	规划干系人管理	管理干系人	控制干系人	



启动过程组的两项主要任务

在PMBOK第6版的10大知识领域中，定义了启动过程组所需要做的两项工作。

- 编制项目章程
- 识别项目干系人（后面介绍）



本章内容

➤项目立项


➤合同项目与内部项目

➤项目授权

➤项目生存期（上学期已经讲过）



软件项目启动

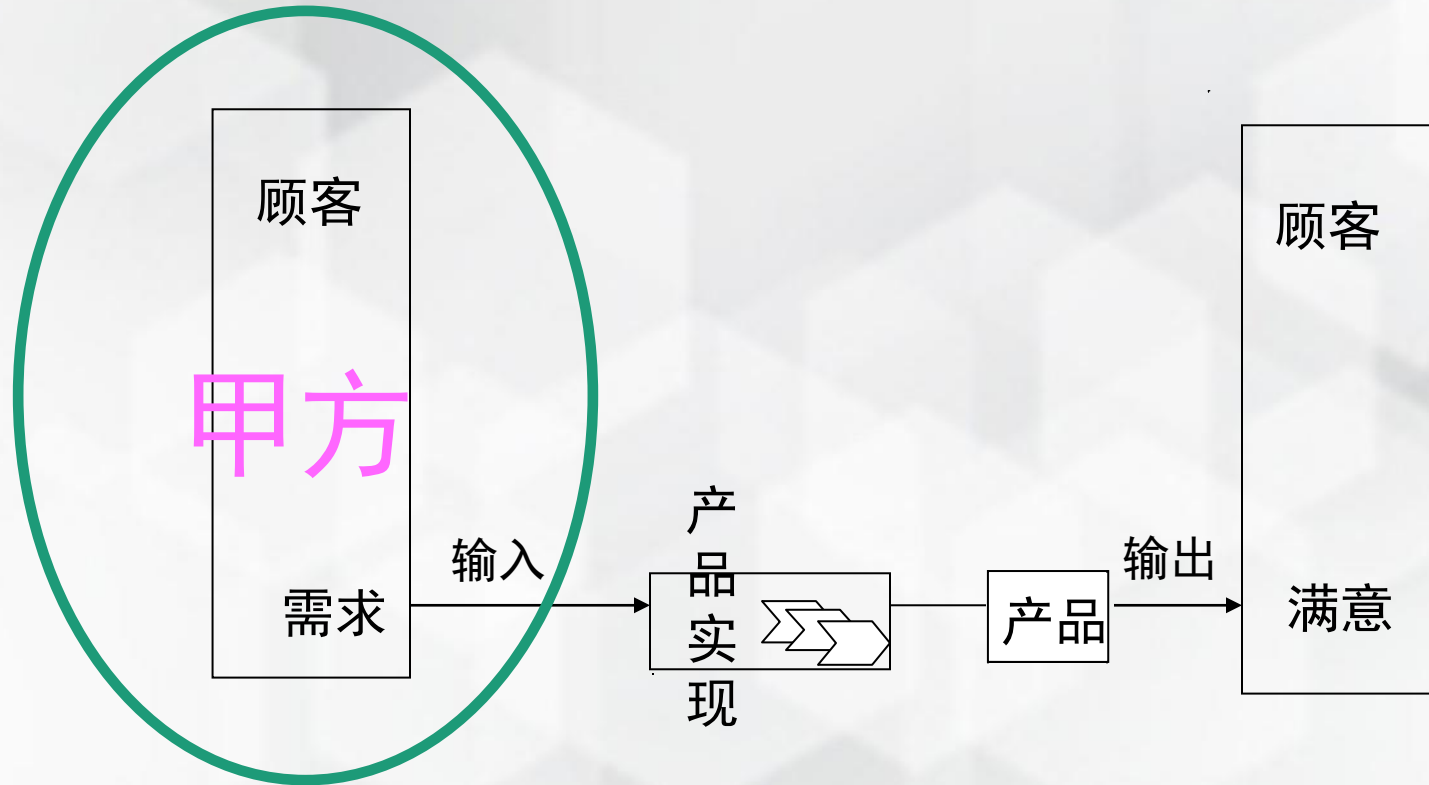



项目立项

明确项目的**目标、时间表、项目需要使用的资源和经费**，而且得到执行该项目的**项目经理和项目发起人**的认可。



Make or Buy 决策

Make-or-Buy决策，确定待开发产品的哪些部分应当“采购”、“外包开发”或者“自主研发”。




Make or Buy 决策实例

- 如果选择自己开发软件的策略，公司需要花费25,000美元，根据历史信息，维护这个软件每个月需要的费用是2,500美元。
- 如果选择购买软件公司产品的策略，需要17,000美元，同时软件公司为每个安装的软件进行维护的费用是每月2,700美元。



Make or Buy 决策实例

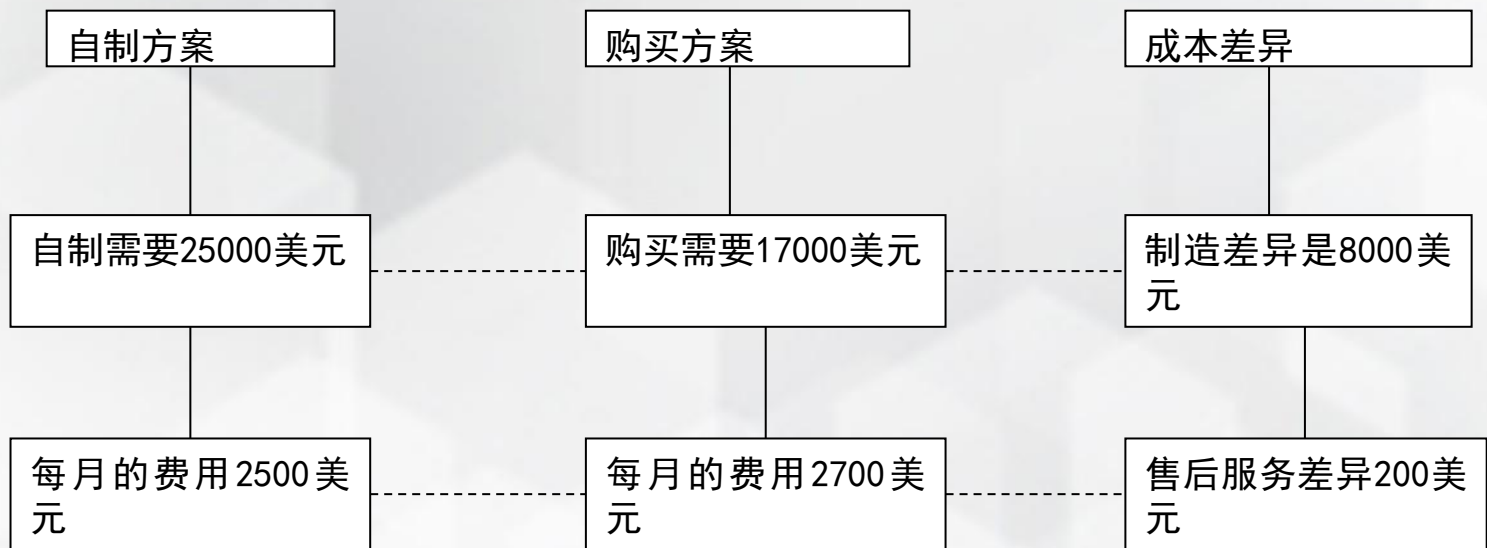

解决方案


自制方案可以承受的月份数： $8000/200=40$

如果软件的使用期在40个月以内，可以选择购买方案。

如果软件的使用期超过40个月，可以选择自制方案。



Make or Buy 决策实例

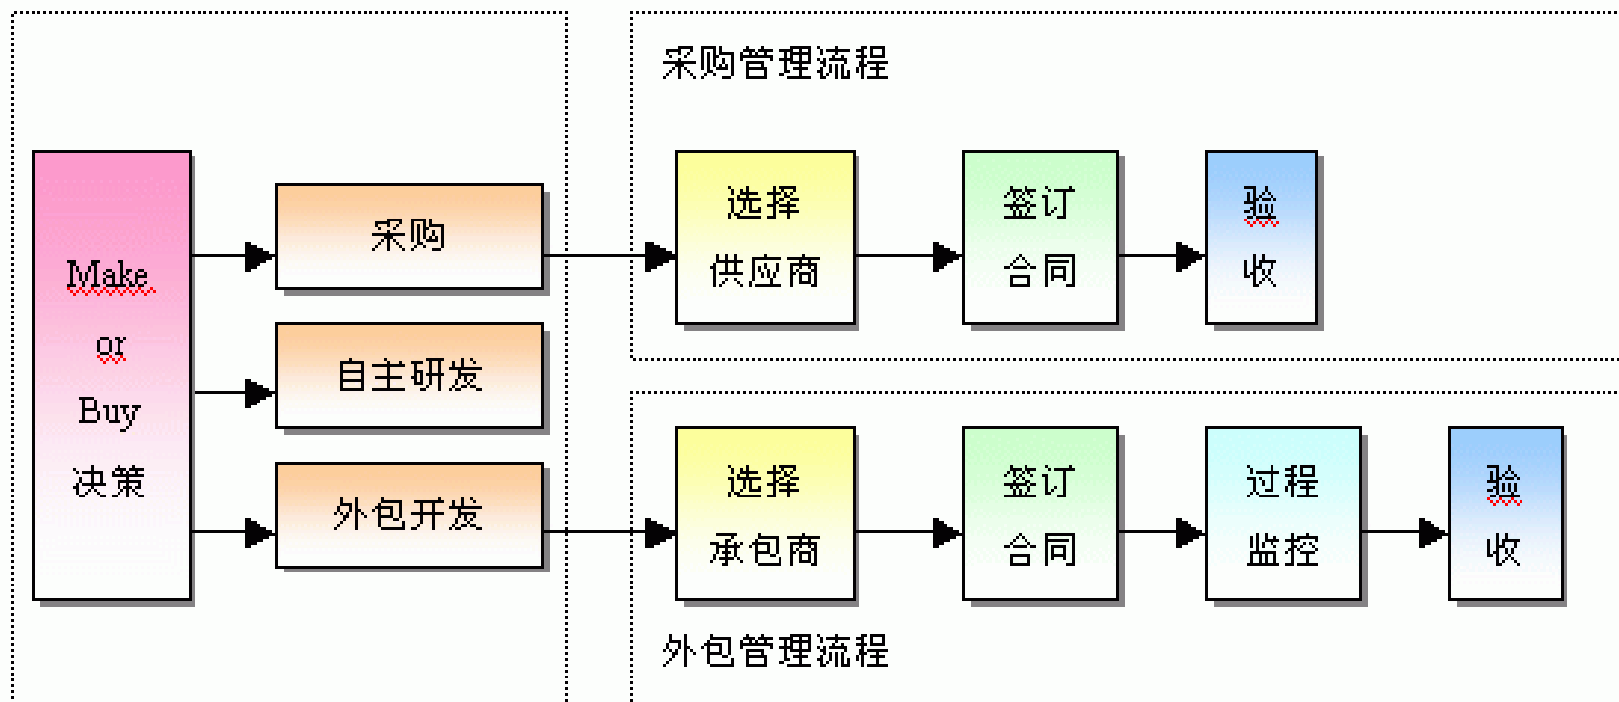



提问

下列不是项目立项过程内容的是（ ）。

- A、项目的目标
- B、项目的风险 ✓
- C、项目的时间表
- D、项目使用的资源和经费



提问

项目立项之后，项目负责人会进行自制-购买决策，确定待开发产品的哪些部分应该采购、外包开发、自主研发等。



本章内容

- 项目立项
- 合同项目与内部项目
- 项目授权
- 项目生存期（上学期已经讲过）



技术合同概念

技术合同是法人之间、法人和公民之间、公民之间以技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务为内容，明确相互权利义务关系所达成的协议。



合同的生存期





甲方合同初始

1. 甲方合同准备
2. 甲方合同签署
3. 甲方合同管理
4. 甲方合同结束



1. 甲方合同准备

1.1 招标书定义过程(采购需求定义)


1.2 供方选择过程

1.3 合同文本准备过程



1. 甲方合同准备

1.1 招标书定义过程(采购需求定义)

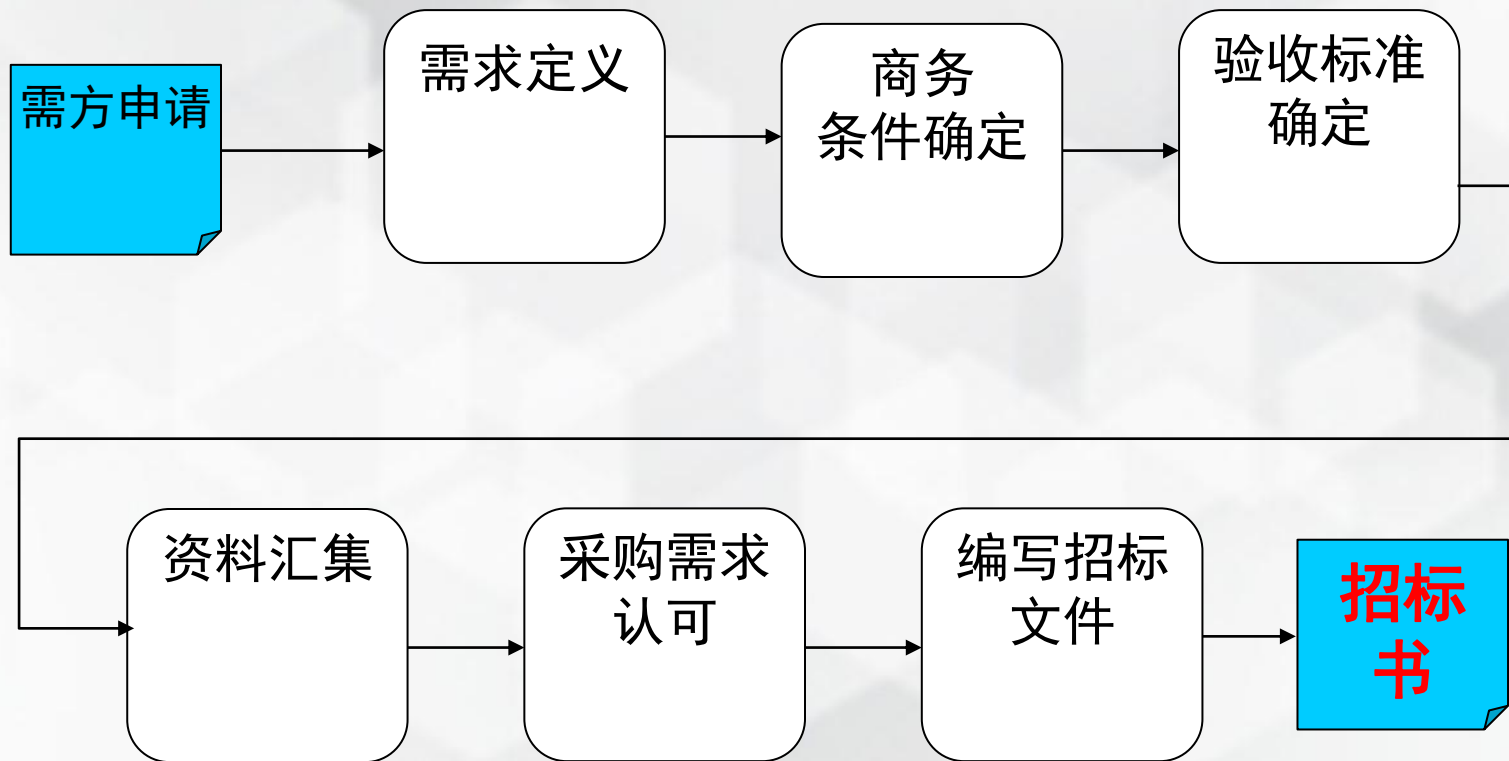


附件：SOW:Statement Of Work (工作说明书)



1. 甲方合同准备


1.2 供方选择过程

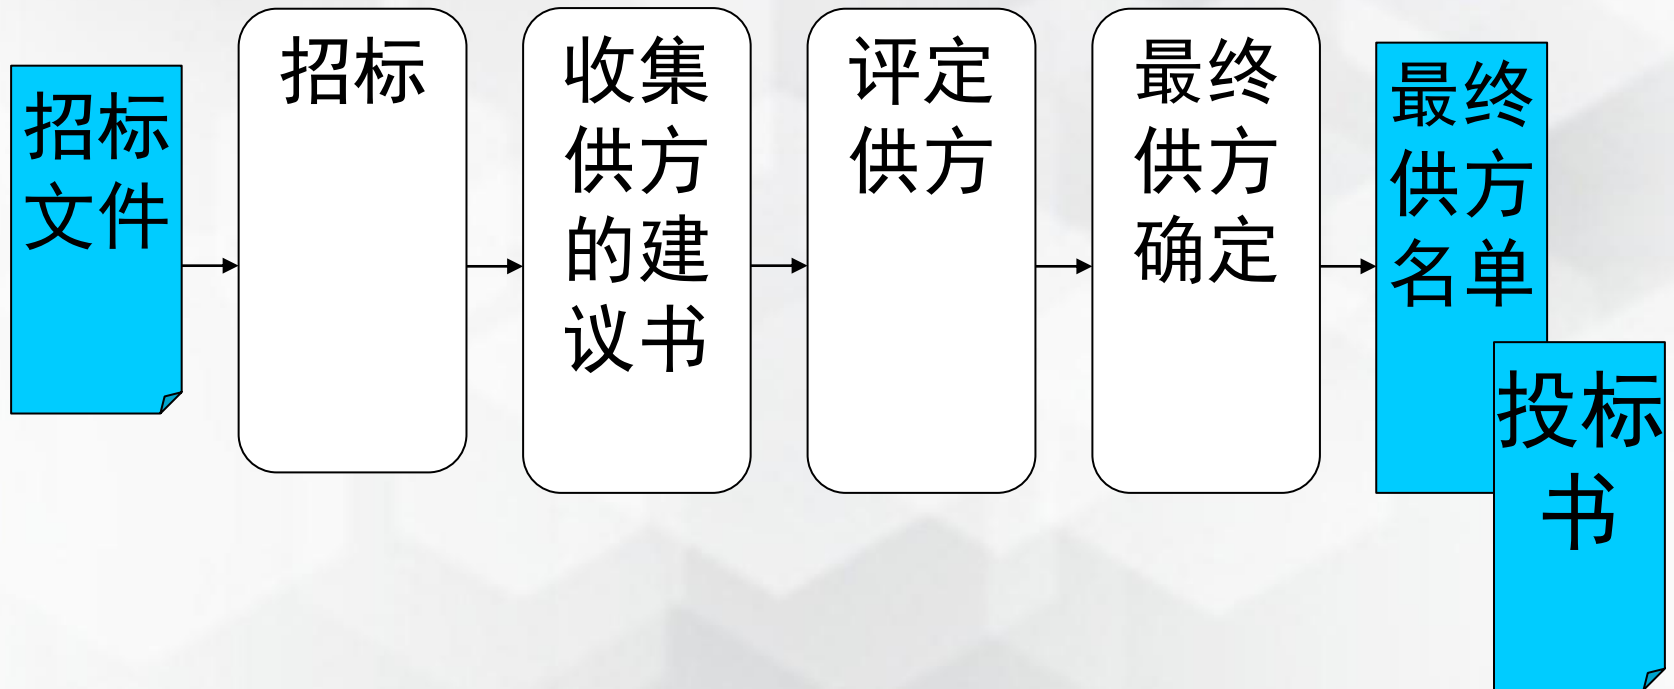




1. 甲方合同准备

1.3 合同文本准备过程

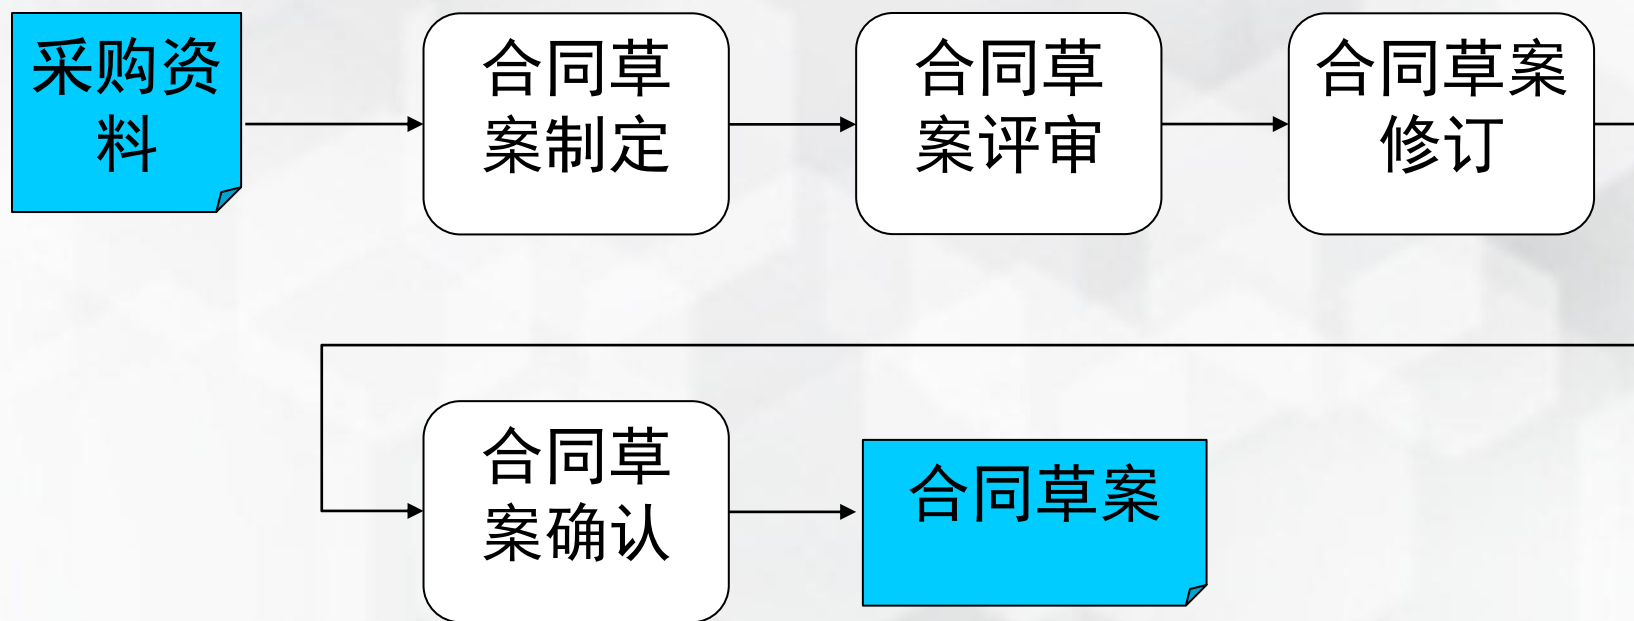



2、甲方合同签署

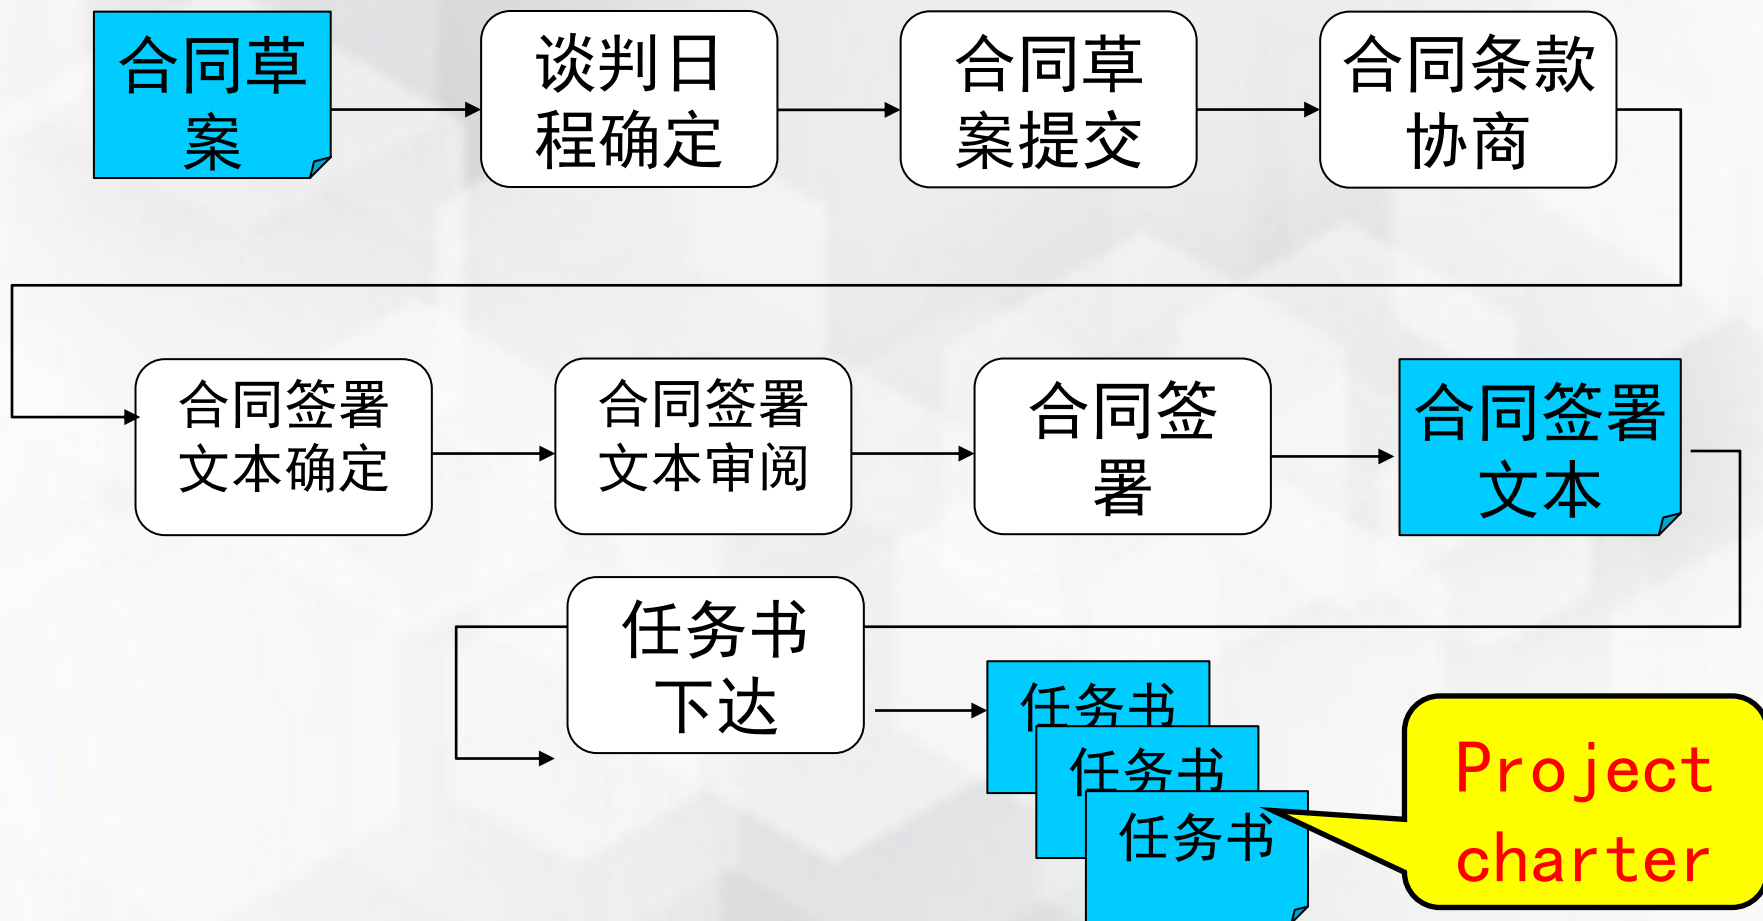



乙方合同初始

1. 乙方合同准备
2. 乙方合同签署
3. 乙方合同管理
4. 乙方合同结束



1、乙方合同准备

1.1 项目分析过程


1.2 竞标过程

1.3 合同文本准备过程



1、乙方合同准备


1.1 项目分析过程

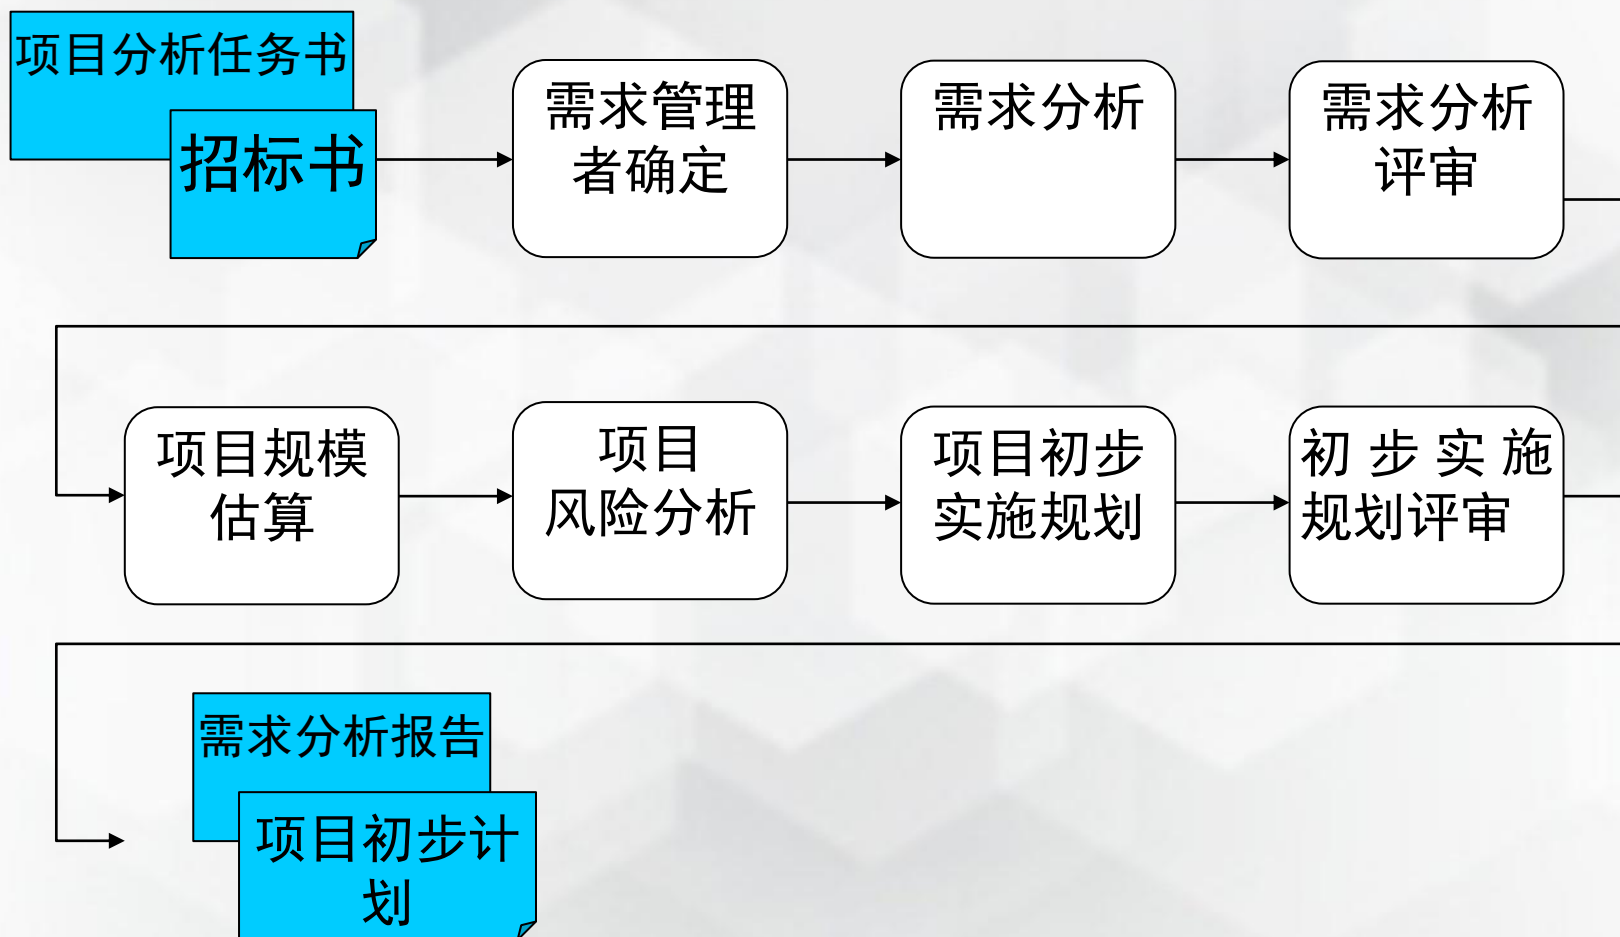



1、乙方合同准备


1.2 竞标过程

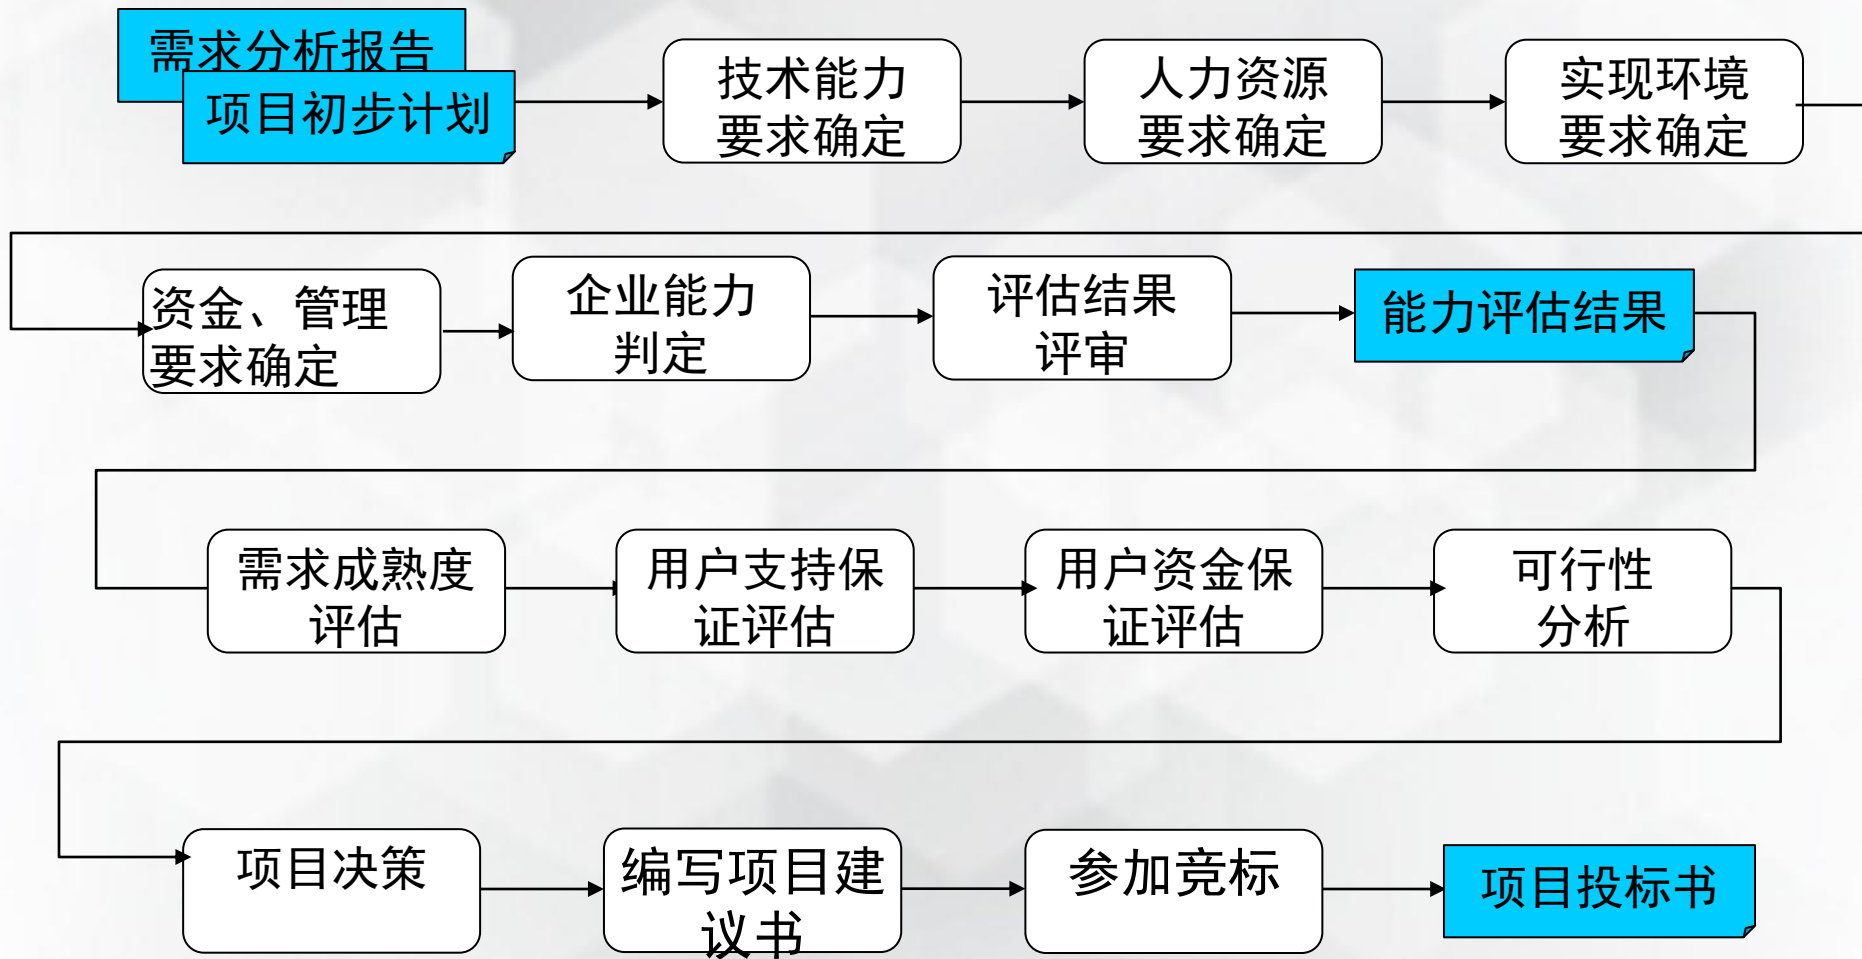



1、乙方合同准备


1.3 合同文本准备过程

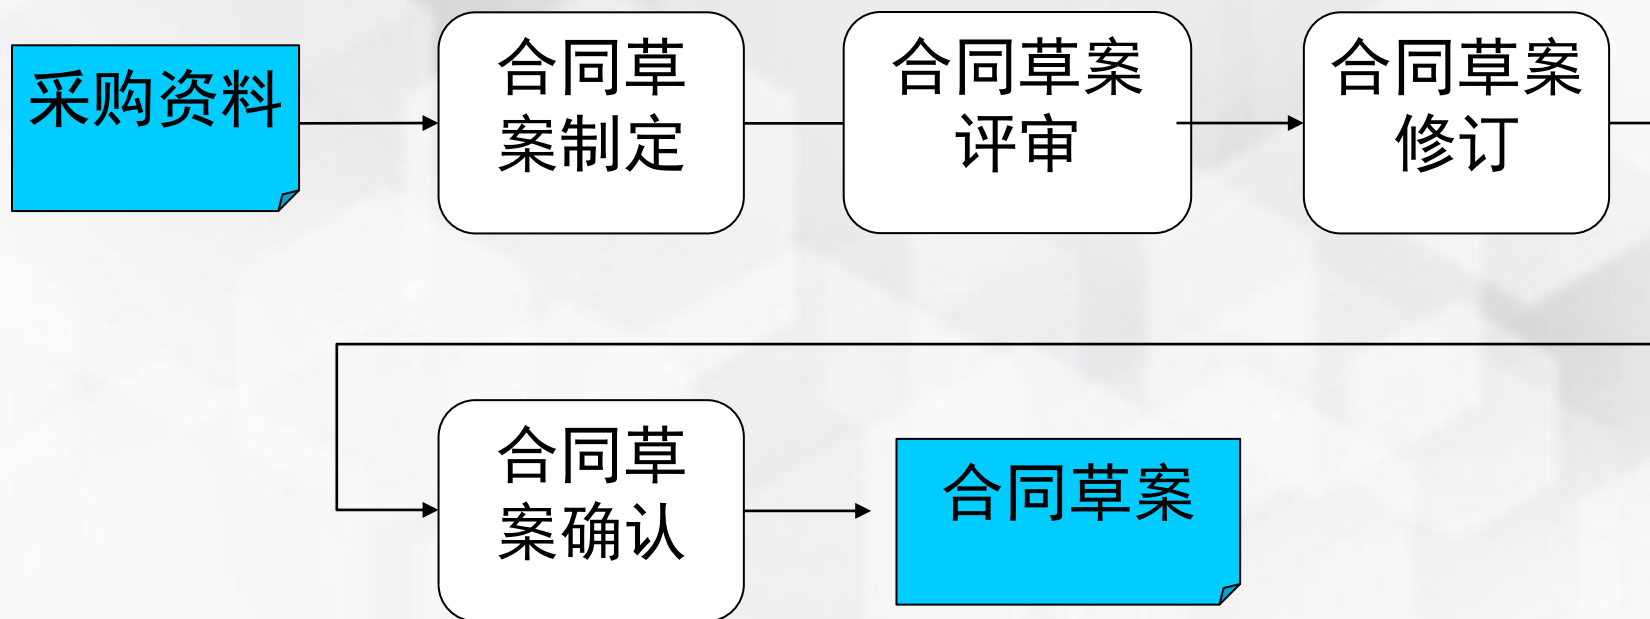

一般情况下，甲方提供合同的框架结构，起草主要内容。
乙方提供意见。



2、乙方合同签署

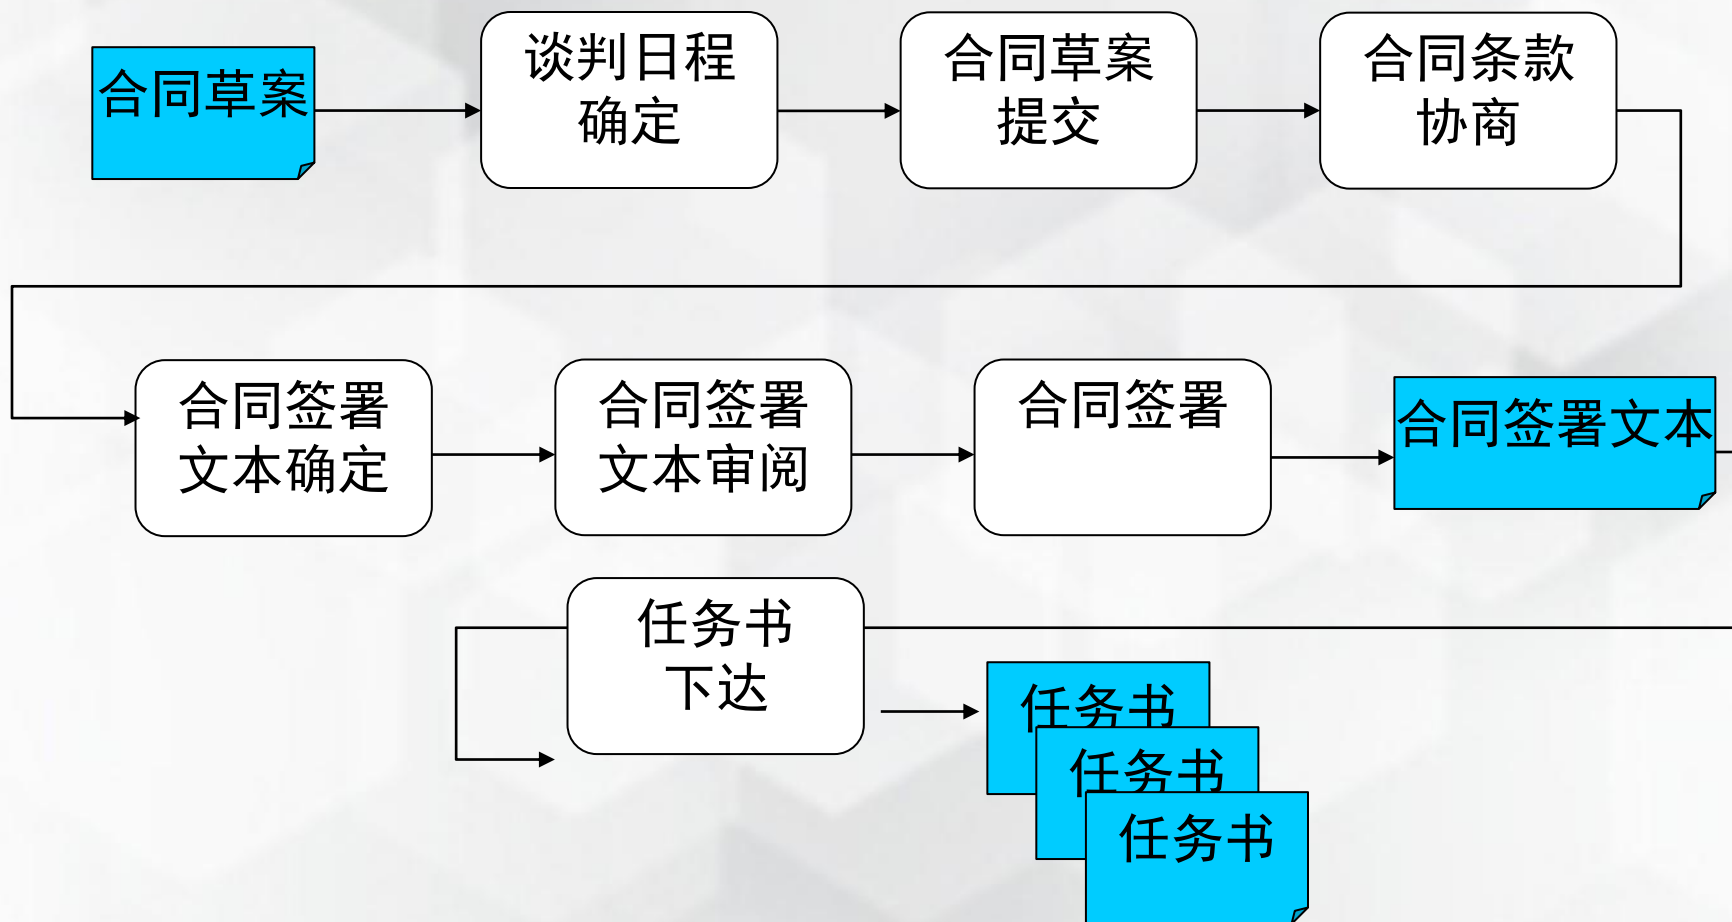



内部项目

企业内部项目实施的核心是**确定任务范围**和**相关各方进行有效地配合**。这将通过相关各方之间的协议来调整。因此，在内部项目实施中，仅仅在合同签署过程中定义了一个协议签署过程。此处协议可视作为“合同”，但无特别的商业约束。其它方面可参考甲乙方的过程。



提问

在招投标阶段，甲方过程包括招标书定义、
供方选择、合同签署。



提问

在招投标阶段，乙方过程包括 项目分析 、
竞标 、 合同签署 。



提问

下列不属于甲方招投标阶段任务的是？（ ）

- A、编写建议书 ✓
- B、招标书定义
- C、供方选择
- D、合同签署



提问

下列不属于乙方招投标阶段任务的是？（ ）

- A、项目分析
- B、竞标
- C、合同签署
- D、招标书定义 ✓




本章内容

- 项目立项
- 合同项目与内部项目
- 项目授权
- 项目生存期（上学期已经讲过）



编制项目章程 (Project Charter)

- 项目章程是项目执行组织高层批准的一份以书面签署形式，正式确认项目存在的文件。
- 它包括对项目的确认、对项目经理的授权和项目目标的概述等。
- 有的项目没有明确的项目章程，但是合同也可以作为项目章程。
- 项目章程的具体内容和例子见p29。

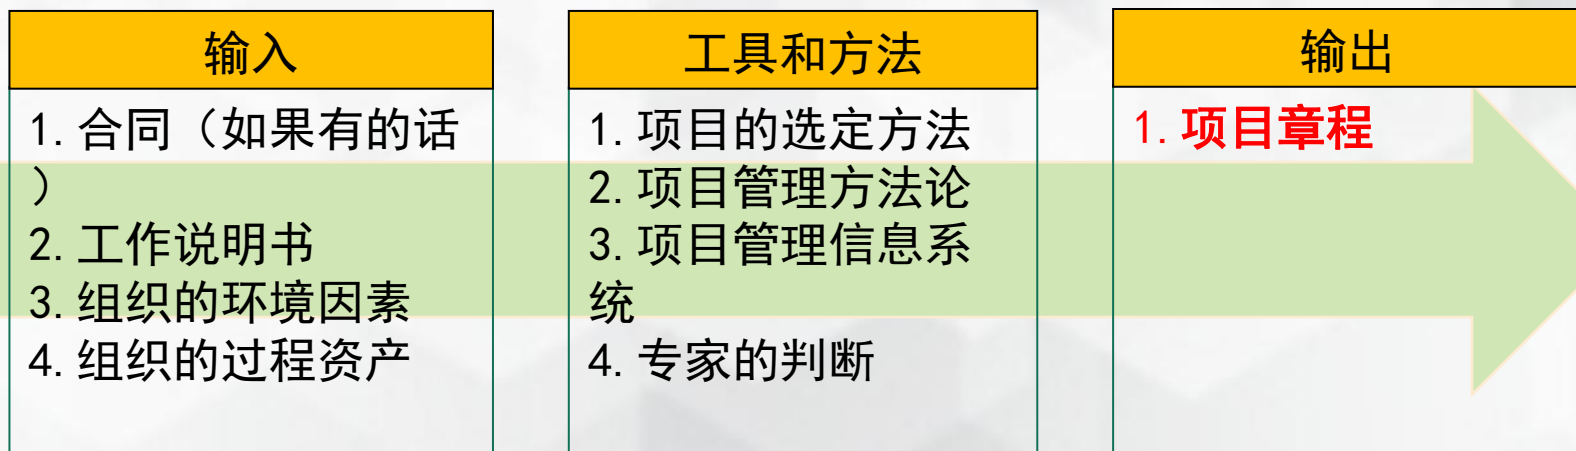



项目经理的角色

- 项目组织的领导者
- 项目组织的管理者
- 项目组织的决策者
- 项目组织的分析者
- 项目组织的计划者
- 项目组织的控制者
- 项目组织的组织者
- 项目组织的评价者
- 项目组织的协调者



项目经理的责任和权力

责任

- 开发项目计划
- 组织项目实施
- 实施项目控制

权力

- 制定项目的有关决策
- 挑选项目成员的权利
- 对项目获得的资源进行再分配



项目经理所应具备的能力

- 对项目的目标有透彻的理解
- 具备了解项目成员需要的能力
- 对细节问题头绪清楚
- 对项目有强烈的责任心
- 能应对挫折和失望
- 具备很好的谈判技巧
- 面向成果，注重实际
- 有成本意识和基本的经营技巧
- 有政治头脑—知道该做什么，不该做什么
- 能忍受模糊不清的煎熬



提问

以下哪项不包括在项目章程中？（ ）

- A、对项目的确认
- B、对项目经理的授权
- C、对项目风险的分析 ✓
- D、对项目目标的描述



提问

项目经理的主要责任是

开发项目计划、

组织项目实施、

实施项目控制。



本章内容

- 项目立项
- 合同项目
- 项目授权
- 项目生存期（上学期已讲授内容）
